




Наименование проекта (полное):	Практико-ориентированность образовательного процесса через создание учебно-производственных площадок
Наименование проекта (сокращенное):	Учебное производство!
Срок начала и окончания проекта	01.01.2018- 31.06.2019
	ФИО, должность
Куратор проекта	Потенихина Надежда Павловна, Директор ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум»
Функциональный заказчик	Центр содействия трудоустройству выпускников, работодатель
Администратор проекта	Мясников Юрий Николаевич, заведующий отделением по УГС

Предпосылки реализации проекта

Наличие учебно-производственных площадок на предприятиях

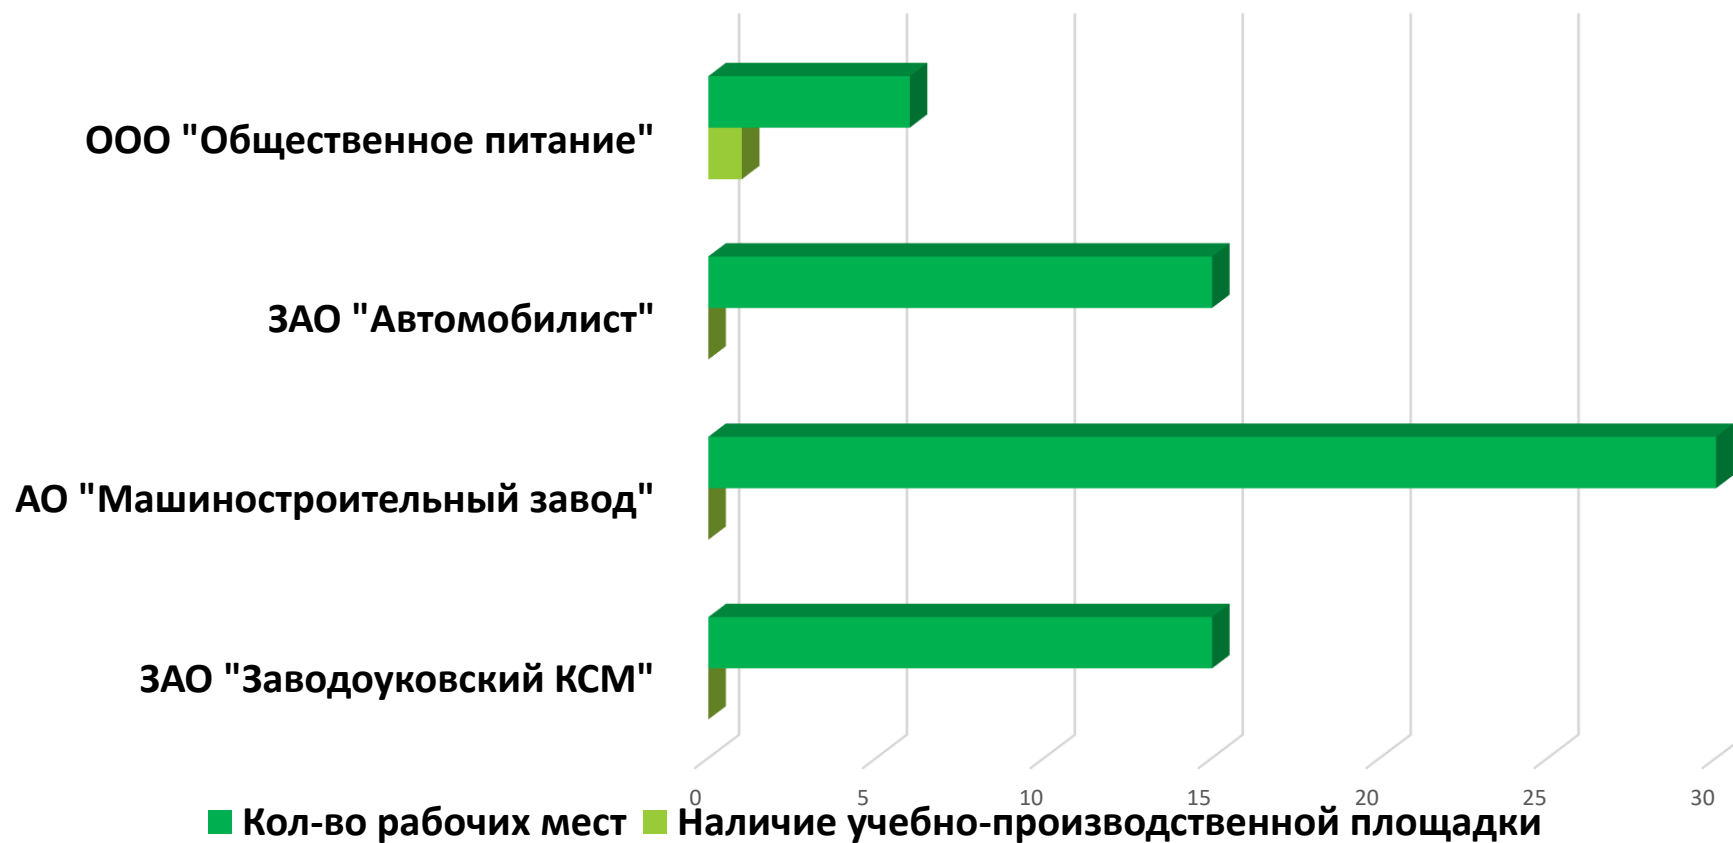

Целеполагание проекта

Цель проекта	Создать условия обучения максимально приближенные к условиям реального производства			
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Базовое значение	2019 год	
			I	II
	Количество учебно-производственных площадок (нарастающим итогом)	0	1	2
	Доля рабочих мест на учебно-производственных площадках по отношению к количеству рабочих мест в лабораториях и мастерских (нарастающим итогом)	0	10%	20%
	Доля обучающихся, занятых на учебно-производственных площадках по отношению к общему контингенту	0	5%	11%
	Доля привлеченных представителей работодателей к проведению учебных занятий в рамках профессионального учебного цикла от общего количества преподавателей профессионального учебного цикла(%)	38%	40%	40%
Доля обучающихся, трудоустроенных по полученной специальности в течении 3-х лет после окончания техникума	68%	68%	72%	

Результаты проекта

Результаты
проекта

1. Приобретение и установка оборудования
2. Организация учебно – производственной деятельности на производственной площадке
3. Привлечение работодателей к работе производственной площадки
4. Повышение конкурентоспособности выпускников на рынке труда

Реестр заинтересованных сторон проекта

№ п/п	Орган или организация	Ожидание от реализации проекта (программы)
1.	Заводоуковский агропромышленный техникум	Повышение престижности образовательной организации Увеличение доли трудоустроенных выпускников по полученным профессиям/специальностям
2.	Работодатели	Увеличение доли выпускников адаптированных к производству
3.	Студенты	Конкурентоспособность на рынке труда

Укрупненный план-график проекта

№	Наименование	Длительность, дней	Начало-окончание	2019 год	
				I	II
1.	Разработка нормативно-правовой базы и совершенствование МТБ	20			
1.1.	Разработка и утверждение Положение об учебно-производственной площадке	10	09.01.19 - 19.01.19		
1.2.	Инвентаризация кадровых и материально-технических ресурсов	10	09.01.19 - 19.01.19		
1.3	Приобретение и установка недостающего производственного оборудования	Постоянно			
2.	Оценка качества подготовки студентов	32			
2.1.	Анализ промежуточной аттестации студентов	7	15.03.19 - 22.03.19		
2.2.	Анкетирование среди студентов, родителей о степени удовлетворенности условиями обучения	5	22.03.19; 15.05.19;		

Укрупненный план-график проекта

№	Наименование	Длительность, дней	Начало-окончание	2019 год	
				I	II
2.3.	Анкетирование среди работодателей о степени удовлетворенности уровнем профессиональной подготовки студентов по результатам производственной практики	10	24.05.19		
2.4.	Анкетирование среди работодателей о степени удовлетворенности уровнем профессиональной подготовки выпускников техникума, трудоустроившихся на предприятии.	10	25.06.19		
3.	Организация взаимодействия с социальными партнерами-работодателями	20			
3.1.	Экспертиза основных и дополнительных профессиональных образовательных программ	20	21.01.19-12.02.19		
3.2.	Привлечение к промежуточной и итоговой аттестации		постоянно		
3.3.	Привлечение представителей работодателей к проведению учебных занятий на учебно-производственных площадках		постоянно		

Календарный план-график проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Длительность, дней	Начало - окончание	Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата)	Ответственный исполнитель
Функциональное направление проекта «Разработка нормативно-правовой базы и усовершенствование МТБ»					
1.	Разработка и утверждение Положения об учебно-производственной площадке	10	09.01.19-19.01.19	Положение об учебно-производственной площадке ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум»	Жихарева Е.А.
2.	Инвентаризация кадровых и материально-технических ресурсов	10	09.01.19-19.01.19	Инвентаризационная ведомость	Мясников Ю.Н.
3.	Приобретение и установка недостающего производственного оборудования	Постоянно		Отчетная документация	Мясников Ю.Н.
Функциональное направление проекта «Оценка качества подготовки студентов»					
4.	Анализ промежуточной аттестации студентов	7	15.03.19-22.03.19	Отчет о проведении аттестации студентов	Мясников Ю.Н.
5.	Анкетирование среди студентов, родителей о степени удовлетворенности условиями обучения	5	22.03.19; 15.05.19;	Анализ проведенного анкетирования	Васильева Н.В.

Календарный план-график проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Длительность, дней	Начало - окончание	Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата)	Ответственный исполнитель
Функциональное направление проекта «Организация мероприятий по развитию чувства патриотизма»					
6.	Анкетирование среди работодателей о степени удовлетворенности уровнем профессиональной подготовки студентов по результатам производственной практики	10	24.05.19	Анализ проведенного анкетирования	Мясников Ю.Н.
7.	Анкетирование среди работодателей о степени удовлетворенности уровнем профессиональной подготовки выпускников техникума, трудоустроившихся на предприятии.	10	25.06.19	Анализ проведенного анкетирования	Мясников Ю.Н.
Функциональное направление проекта «Организация взаимодействия с социальными партнерами-работодателями»					
8.	Экспертиза основных и дополнительных профессиональных образовательных программ	20	21.01.19-12.02.19	Экспертное заключение	Мясников Ю.Н.
9.	Привлечение к промежуточной и итоговой аттестации		постоянно	Протокол промежуточной и итоговой аттестации	Харлова Ж.А.

Реестр рисков и возможностей проекта

№ п/п	Наименование риска/возможности	Действия по предупреждению риска/реализации возможности
1.	Недостаток финансирования	Поиск дополнительных источников финансирования
2.	Сбой графиков поставки оборудования	Прямое контактирование с поставщиками и коррекция сроков поставки оборудования
3.	Технические неисправности оборудования	Предусмотреть возможность приобретения, ремонта или аренды оборудования
4.	Низкий уровень мотивированности студентов, педагогов.	Усилить работу над развитием профессионально-ценностными мотивами (расширение возможностей устроиться на перспективную и интересную работу)

Бюджет проекта

Наименование	СТОИМОСТЬ
Оборудование дополнительных рабочих мест	370 000
Расходные материалы	120 000
Специализированные инструменты и приспособления	150 000
Итого:	640 000

КОМАНДА ПРОЕКТА

№ п/п	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.	Потенихина Надежда Павловна	Директор техникума, ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум»	Куратор проекта
2.	Мясников Юрий Николаевич	Заведующий отделением по УГС	Руководитель проекта
3.	Харлова Жанна Александровна	Заместитель директора по УПР, ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум»	Администратор проекта
